

# Projektplan

## MISlife 2.0

2016-12-02

# Bakgrund och syfte MISlife 2.0

## Vision och utgångspunkter

- En gemensam standard för överföring av försäkringsinformation (jämfört med nuläget - 1.6.2 och 1.7)
- MisLife 2.0 behöver innehålla mer information jämfört med dagens standarder – förmånsbestämd försäkring, riskförsäkring, gruppörsäkring saknas helt eller delvis i dagens version
- Ökad kvalitet genom bättre definierad information – Stort tolkningsutrymme och varierande kvalitet i dagens version
- Regelverk och struktur behöver uppgraderas

# Projektomfattning och mål

Projektet ska utveckla en standard för kommunikation av försäkringsinformation mellan förmedlare och försäkringsbolag/depåinstitut för Kollektivavtalad och Icke Kollektivavtalad affär inkl. Grupp-, premiebestämd- och förmånsbestämd försäkring.

Projektet ska leverera en testad/verifierad\* version av XML samt en tillhörande beskrivning av standarden.

Versionen ska ge ett bra och utökad stöd inom följande områden:

- Försäkringsskydd (spar, risk inkl förmånsbestämt)
- Administrativa aspekter (exv avtalsnr)
- Andra aspekter (exv garanterad avkastning)

Standarden ska innehålla informationsmodell, tekniskt format, regler och beskrivning och ska inte påverkas av bolagens eventuella begränsningar i system, produkter eller likande.

*\* Med testad/verifierad menas en manuellt verifierad XML hos 2 avsändande och 2 mottagande bolag.*

# Avgränsningar

- Information som ej är definierad i standarden
  - Överföring av information som ej är definierad i standarden omfattas ej av projektet
- Etablering av processer, strukturer och metoder för standardiseringsarbete inom S4I
  - Projektet kommer att följa de processer som fastställs inom S4I (och föreslå förbättringar), men ansvarar inte för att utveckla dessa generella processer
- Implementation hos intressebolagen
  - Projektet tar fram standarden, men bolagens egen implementation av standarden är avgränsat från projektet

# Projekt = Grön bakgrund

## Steg 2

- Informationsmodell
- Begreppsmodell
- Valcentralernas behov
- Etc...

## Projekt

- Informationsmodell master
- Begreppsmodell
- Innehåll
- Försäkringsskydd (spar, risk inkl förmånsbestämt)
- Administrativa aspekter (exv avtalsnr)
- Andra aspekter (exv garanterad avkastning)

## Nivå av support

- Stöd vid implementation
- Nivå på dokumentation

## Organisation och bemanning "Tekniskt kansli"

- Tillhandahålla verktyg
- Validering- och dok.
- Tester

## Processer och mallar


- Beslutsprocess (projekt resp. förvaltning)
- Ändringshantering
- Versionshantering
- Krav och test
- Budget

**Valcentral**

**Kollektivavtalad och Icke kollektivavtalad affär**

**Etablering S4I – struktur och metoder**

# Grov tidplan

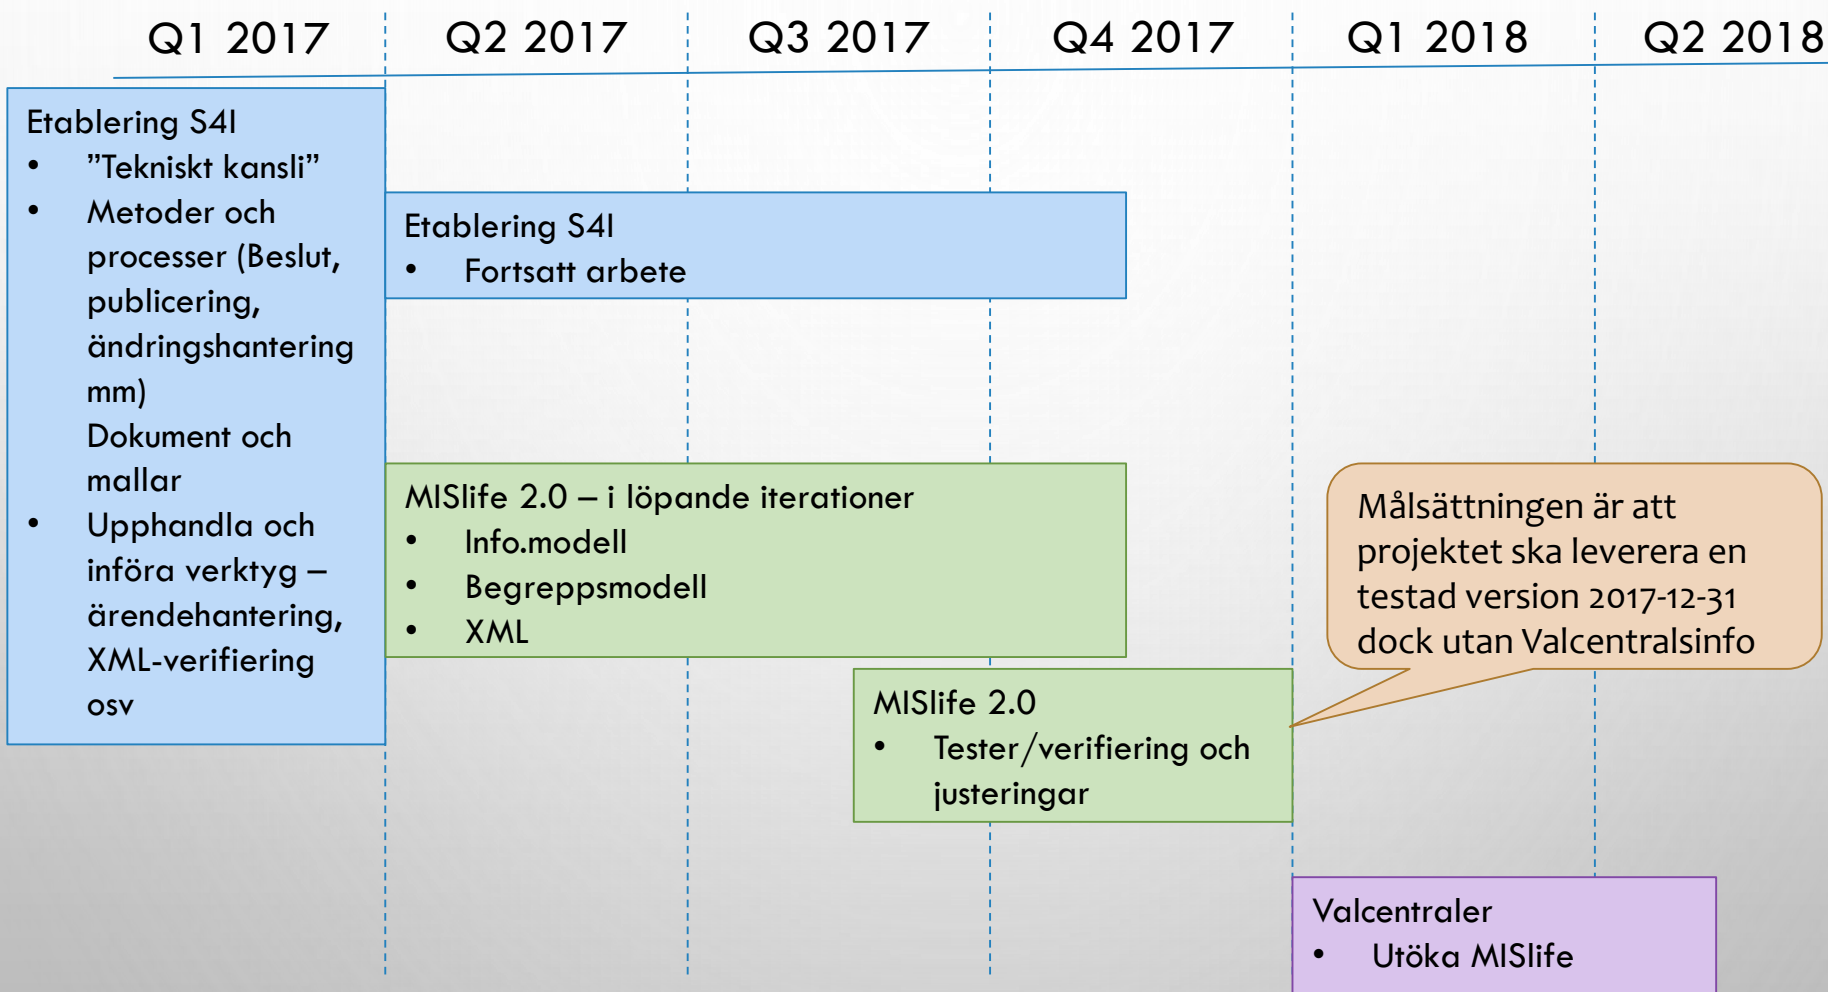

# Tid och aktivitetsplan

<b>Beslut om omfattning, mål och budget</b>	<b>2016</b>
<b>Iteration 1 (omfattning ej fastställd)</b> Genomgång informationsmodell Utveckla 1:a version av XML Fastställa tekniska regler på XML - icke funktionella krav mm Fastställa verksamhetsregler på XML - obligatoriska fält mm Förankra med Referensgrupp	Apr - Maj 2017
<b>Iteration 2 (omfattning ej fastställd)</b> Genomgång informationsmodell Utveckla 2:a version av XML Fastställa tekniska regler på XML - icke funktionella krav mm Fastställa verksamhetsregler på XML - obligatoriska fält mm Förankra med Referensgrupp	Jun - Aug 2017
<b>Genomföra test/verifiering med testbolag</b> Manuell verifiering (utan systemintegration) av XML och regelverk av MIS 2.0, avsändare och mottagare Genomföra löpande justeringar som upptäcks i test	Sept – Dec 2017
<b>Fastställa MISlife 2.0 (utan Valcentralsinformation)</b>	Dec 2017
<b>Kravutredning Iteration 3 (Valcentralsinformation)</b> Genomgång informationsmodell Utveckla 1:a version av XML Fastställa tekniska regler på XML - icke funktionella krav mm Fastställa verksamhetsregler på XML - obligatoriska fält mm Förankra med Referensgrupp	Jan - Feb 2018
<b>Genomföra test/verifiering med testbolag</b> Manuell verifiering (utan systemintegration) av XML och regelverk av Valcentralsinfo, avsändare och mottagare Genomföra löpande justeringar som upptäcks i test	Sept – Dec 2017
<b>Fastställa MISlife 2.0 inkl Valcentralsinformation</b>	Mar 2018
<b>Projektavslut</b> Lanseringsplan fastställs. Projektet överlämnas till förvaltning och avslutas	Apr 2018

# Resurser

## Projektteam

- Projektledning Angelica N
- Kravledning Vakant
- Informationsmodellering Mathias Lindström,
- XML-arkitekt och utvecklare Vakant

## Referenspersoner från bolagen

- Referenspersoner tekniska krav – MIS-kompetens (teknisk kunskap om MIS och hur XML-strukturen och dess regelverk påverkar användningen)
- Referenspersoner verksamhetskrav – MIS-kompetens (ska kunna kravställa obligatoriska resp valfria fält, förståelse för hur MISlife används)
- Alla bolag utser referenspersoner som projektet kan/ska kontakta för löpande information och avstämningar under projektet.

**Pilot:** 4 pilotbolag – 2 avsändare och 2 mottagare



# Budget MISlife 2.0

Budget 2017 1,5 MSEK

Budget 2018 0,9 MSEK

**TOTALT 2,4 MSEK**

Tid och budget			Timpris ex moms	1200
<b>Övergripande aktiviteter</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>	<b>Totalt</b>	
Projektleddning	8	40	320	384 000
Kravanalys (möten, dokumentation mm)	8	20	160	192 000
Metod, beslut, dokumentation	40	1	40	48 000
Överlämning till förvaltning	40	1	40	48 000
Lanseringsplan	40	1	40	48 000
			<b>Totalt</b>	720 000
<b>Iteration 1</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>		
Informationsmodellering	20	8	160	192 000
Begreppsmodellering	4	1	4	4 800
XML-ifiering	20	8	160	192 000
<b>Iteration 2</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>		
Informationsmodellering	20	8	160	192 000
Begreppsmodellering	4	1	4	4 800
XML-ifiering	20	8	160	192 000
			<b>Totalt</b>	777 600
<b>Tester/Verifiering</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>		
Möten + dokumentation	16	16	256	307 200
Informationsmodellering	8	10	80	96 000
XML-ifiering	8	10	80	96 000
			<b>Totalt</b>	499 200
<b>TOTALT 2017</b>			<b>Totalt</b>	1 497 600
<b>Iteration 3 - Valcentralsinfo</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>		
Informationsmodellering	20	8	160	192 000
Begreppsmodellering	4	1	4	4 800
XML-ifiering	20	8	160	192 000
			0	-
			<b>Totalt</b>	388 800
<b>Tester/Verifiering Valcentralsinfo</b>				
	<b>Tim/vecka</b>	<b>Antal veckor</b>		
Möten + dokumentation	16	16	256	307 200
Informationsmodellering	8	10	80	96 000
XML-ifiering	8	10	80	96 000
			<b>Totalt</b>	499 200
<b>TOTALT 2018</b>			<b>Totalt</b>	888 000
<b>PROJEKTET TOTALT</b>			<b>Totalt</b>	2 385 600
